SIGE

SOCIETE D'INSPECTIONS GENERALES D'EQUIPEMENTS

Travaillons en toute sécurité !



INSPECTIONS-FORMATIONS-CONSEILS-ASSISTANCES-AUDIT TECHNIQUES
ARRETE N° 00050 MEPS/CAB du 19 MAI 2025 PORTANT AGREMENT

RAPPORT D'AUDIT TECHNIQUE D'INSTALLATION D'ECHAFAUDAGES SUR LES DIFFERENTES FAÇADES DU PROJET EKACICO PLATEAU GENDARMERIE

Société d'Inspection Générale d'Equipement	NATURE DE LA VERIFICATION : **AUDIT D'INSTALLATION D'ECHAFAUDAGE**	Fabricant : / Année de Fabrication : /
Date de Vérification : **03 JUIN 2026**		Prochaine Vérification Avant le : **02 SEPTEMBRE 2026**
Propriétaire : **EKACICO**		Site de contrôle : **PLATEAU GENDAMERIE**

Ce présent rapport fait état de toutes les installations d'échafaudages vérifiées sur les différentes façades de l'immeuble EKACICO PLATEAU GERDARMERIE.

Les observations émanant de cette vérification concernent l'ensemble des installations.

Famille : **Echafaudage fixe**		Localisation
Nature **Echafaudage de pied**		**PLATEAU GENDAMERIE**
Model : **Document non fourni**	Numéro de série Planchers **Document non fourni**	N'interne : **Document non fourni**

Textes de référence :	**Arrêté du 21 décembre 2004** **Code du Travail (Décret N°67-321 du 21 Juillet 1967)**
Type de Vérification :	**Etat de conservation et Conformité de l'installation**
Périodicité :	**Trimestrielle**

IDENTIFICATION

Marque NF : /		
Nature des travaux : Travaux de façade d'un immeuble R+14	Durée estimée : **/**	Montage effectué par la société **EKACICO**

CARACTERISTIQUES

Dimensions : ☐ **Longueur : /** ☐ **Largeur : 1 m** ☐ **Hauteur : 49 m**	Charges d'utilisation **/ Kg/m²**	Type de structure **ACIER**
Description **:** **L'échafaudage faisant l'objet de cette mission n'est pas monté en sa totalité de tous ses éléments.** **-** Planchers Maxi : / - Planchers contrôlés et utilisés pour le travail : /		Appuis sur **SOCLE**

Nombre de niveaux de planchers équipés **14**	Nombre et type d'accès par plancher **/**	Nombre de Stabilisateurs **/**	Recouvert (Bâches, filets, bardage) **Oui**	Engins de levage : **Non Applicable** Avec Sapine : **non**

Société d'Inspection Générale d'Equipement	NATURE DE LA VERIFICATION : **AUDIT D'INSTALLATION D'ECHAFAUDAGE**	Fabricant : / Année de Fabrication : /
Date de Vérification : **03 JUIN 2026**		Prochaine Vérification Avant le : **02 SEPTEMBRE 2026**
Propriétaire : **EKACICO**		Site de contrôle : **PLATEAU GENDAMERIE**

A – ASPECTS DOCUMENTAIRES

OBJET DE LA VERIFICATION	AVIS	ACTION(S) A ENTREPRENDRE(S)
Entourer les Avis retenus. NV = Non vérifié, NA = Non applicable, AE = Action à Entreprendre. S= Satisfaisant, NP= Non présenté		
A.1 Affichages	AE	Afficher sur chaque échafaudages la charge maximale d'utilisation (CMU) et les consignes de sécurité.
A.2 Notice d'instruction	NP	Disposer de la notice d'instruction sur le site ;
A.3 Notice de montage	NP	Disposer de la notice de montage sur le site ;
A.4 Notice d'installation et d'utilisation	NP	Disposer de la notice d'installation et d'utilisation sur le site.
A.5 Rapport de Sol ou de support	NA	
A.6 Rapport Effet de vent	NV	*Aucun rapport d'effet de vent ne nous a été transmis.*
A.7 Rapports de vérification	NV	*Aucun rapport de vérification précédant présenté.*
A.8 Note de calcul	NV	*Aucune note de calcul ne nous a été transmis*

B – POINTS INSPECTES

OBJET DE LA VERIFICATION	AVIS	ACTION(S) A ENTREPRENDRE(S)
Entourer les Avis retenus. NV = Non vérifié, NA = Non applicable, AE = Action à Entreprendre. S= Satisfaisant		
1-Implantation		
1.1 Liberté d'accès / Base, 4 pieds à roues	AE	Installer les échelles d'accès pour faciliter l'utilisations des échafaudages installés.
1.2 Ecoulements des eaux pluviales, circulation des piétons	NA	
1.3 Choix des points d'appuis	S	
2-APPUIS		
2.1 Résistance des appuis	S	
2.2 Calage / Stabilisateur	S	
2.3 Platines	S	
2.4 Vérins	NA	
3-STRUCTURE		
3.1 Compatibilité et mise en œuvre des éléments	AE	*Retirer de l'installation les planchers non compatibles.*
3.2 Portique de départ	S	
3.3 Poteaux / Croisillon	S	
3.4 Clavetage des montants	S	
4-AMENAGEMENTS		
4.1 Bâchage, tôlage, filets	AE	*Procéder à la pose de filet sur l'ensemble de l'installation*

Société d'Inspection Générale d'Equipement	NATURE DE LA VERIFICATION : **AUDIT D'INSTALLATION D'ECHAFAUDAGE**	Fabricant : / Année de Fabrication : /
Date de Vérification : **03 JUIN 2026**		Prochaine Vérification Avant le : **02 SEPTEMBRE 2026**
Propriétaire : **EKACICO**		Site de contrôle : **PLATEAU GENDAMERIE**

OBJET DE LA VERIFICATION	AVIS	ACTION(S) A ENTREPRENDRE(S)
Entourer les Avis retenus. NV = Non vérifié, NA = Non applicable, AE = Action à Entreprendre. S= Satisfaisant		
4.2 Sapine de levage / Engins de levage	NA	
4.3 Pare gravois	S	
5-STABILITE		
5.1 Résistance des appuis / descente de charges	S	
5.2 Contreventements	AE	*Procéder à l'installation des diagonales, et des traverses manquantes.* *Positionner et Verrouiller sur l'ensemble de l'installation les diagonales non verrouillées.* *Procéder au remplacement des traverses déformées*
5.3 Ancrages	AE	*Revoir le serrage et le positionnement des points d'encrage déjà installés.* *Le nombre de point d'ancrage par rapport à l'installation est insuffisant. Renforcer les points d'encrage afin de garantir la stabilité des installations.*
5.4 Amarrages	AE	*Rendre stables les éléments d'amarrage déjà installés.* *Le nombre d'éléments d'amarrage au bâtiment des échafaudages reste insuffisant sur l'ensemble de l'installation.* *Procéder aux renforcements de ceux-ci en installant de nouveaux éléments d'amarrage sur l'ensemble de l'installation pour réduire le balancement.*
5.6 Plan longitudinale	AE	*Voir observation 5.2* Contreventements
5.7 Plan horizontal	AE	*Voir observation 6.1* Plateaux préfabriqués
5.8 Plan transversale	AE	*Voir observations 5.4 Amarrage*

B – POINTS INSPECTES

OBJET DE LA VERIFICATION	AVIS	ACTION(S) A ENTREPRENDRE(S)
Entourer les Avis retenus. NV = Non vérifié, NA = Non applicable, AE = Action à Entreprendre. S= Satisfaisant		
6- PLANCHERS		
6.1 Plateaux préfabriqués	AE	Le nombre de plateau par rapport à toute l'installation est insuffisants. Installer les plateaux stockés.
6.2 Plancher bois	NA	
6.3 Largeur minimale	S	
6.4 Hauteur libre de circulation	S	
6.5 Distance plancher/façade	S	

Société d'Inspection Générale d'Equipement	NATURE DE LA VERIFICATION : **AUDIT D'INSTALLATION D'ECHAFAUDAGE**	Fabricant : / Année de Fabrication : /
Date de Vérification : **03 JUIN 2026**		Prochaine Vérification Avant le : **02 SEPTEMBRE 2026**
Propriétaire : **EKACICO**		Site de contrôle : **PLATEAU GENDAMERIE**

OBJET DE LA VERIFICATION	AVIS	ACTION(S) A ENTREPRENDRE(S)
Entourer les Avis retenus. NV = Non vérifié, NA = Non applicable, AE = Action à Entreprendre. S= Satisfaisant		
6.6 Horizontalité	S	
6.7 Fixation / Verrouillage	AE	Procéder au verrouillage des plateaux installés.
7- DISPOSITIFS DE PROTECTION COLLECTIVE		
7.1 Côté extérieur	AE	*Procéder à l'installation des diagonales.* *Positionner et Verrouiller sur l'ensemble de l'installation les diagonales non verrouillées.*
7.2 Côtés latéraux	AE	*Installer des traverses sur les côtés latéraux de chaque façade.*
7.3 Côté Intérieur	AE	*L'Ecart entre les traverses installer est grand, installer de nouvelles traverses pour renforcer la protection des utilisateurs.*
8- ACCES		
8.1 Escaliers	NA	
8.2 Echelles	AE	*Installer des échelles permettant l'accès à tous les niveaux.*
9- PROTECTION VIS-A-VIS DES TIERS		
9.1 Interdiction d'accès	AE	*Afficher sur l'équipement : Accès interdit à toute personne non autorisée.*
9.2 Lignes électriques	NA	
9.3 Antennes	NA	
9.4 Risques de collision	NA	
9.5 Protection contre les chutes d'objets	AE	*Procéder à l'installation de filet sur chaque de façade.*

Société d'Inspection Générale d'Equipement	NATURE DE LA VERIFICATION : **AUDIT D'INSTALLATION D'ECHAFAUDAGE**	Fabricant : / Année de Fabrication : /
Date de Vérification : **03 JUIN 2026**		Prochaine Vérification Avant le : **02 SEPTEMBRE 2026**
Propriétaire : **EKACICO**		Site de contrôle : **PLATEAU GENDAMERIE**

C- AVIS GENERAL

L'INSPECTION DE L'ECHAFAUDAGE MONTE SUR CHAQUE FAÇADE A MIS EN EVIDENCE DES NON CONFORMITES PRESENTANT DES RISQUES POUVANT METTRE EN DANGER LES UTILISATEURS.

LES ACTIONS A ENTREPRENDRE MENTIONNEES DANS LE TABLEAU DOIVENT ETRE REALISEES ET FAIRE L'OBJET D'UNE LEVEE DE RESERVE AVANT TOUTE UTILISATION.

LES INSTALLATIONS D'ECHAFAUDAGES VERIFIEES SUR CHAQUE FAÇADE SONT NON CONFORMES ET NE PEUVENT PAS ETRE UTILISEES.

ACTIONS A ENTREPRENDRE

OBLIGATION DE LEVER LES RESERVES

Fait à Abidjan, le 06 Juin 2026

L'Inspecteur

ERNEST EHOUE BONZOU

Le Responsable

S.I.G.E
Société d'Inspections Générales d'Equipements
Tél: 07 08 21 26 44 / 01 51 81 70 25
RCCM: CI-ABJ-03-2021-B13-05773
N°CC 2173917 Q

Société d'Inspection Générale d'Equipement	NATURE DE LA VERIFICATION : **AUDIT D'INSTALLATION D'ECHAFAUDAGE**	Fabricant : / Année de Fabrication : /
Date de Vérification : **03 JUIN 2026**		Prochaine Vérification Avant le : **02 SEPTEMBRE 2026**
Propriétaire : **EKACICO**		Site de contrôle : **PLATEAU GENDAMERIE**

ANNEXE PHOTO

Société d'Inspection Générale d'Equipement	NATURE DE LA VERIFICATION : **AUDIT D'INSTALLATION D'ECHAFAUDAGE**	Fabricant : / Année de Fabrication : /
Date de Vérification : **03 JUIN 2026**		Prochaine Vérification Avant le : **02 SEPTEMBRE 2026**
Propriétaire : **EKACICO**		Site de contrôle : **PLATEAU GENDAMERIE**



INSTALLATION D'ECHAFAUDAGE VERIFIEE


Société d'Inspection Générale d'Equipement	NATURE DE LA VERIFICATION : **AUDIT D'INSTALLATION D'ECHAFAUDAGE**	Fabricant : / Année de Fabrication : /
Date de Vérification : **03 JUIN 2026**		Prochaine Vérification Avant le : **02 SEPTEMBRE 2026**
Propriétaire : **EKACICO**		Site de contrôle : **PLATEAU GENDAMERIE**



Diagonale non verrouillée



Traverse déformée

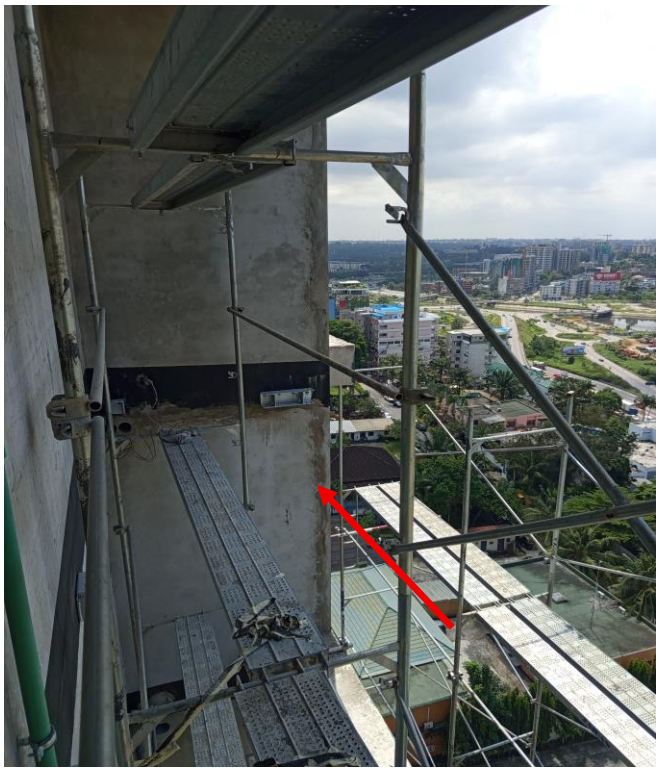



Société d'Inspection Générale d'Equipement	NATURE DE LA VERIFICATION : **AUDIT D'INSTALLATION D'ECHAFAUDAGE**	Fabricant : / Année de Fabrication : /
Date de Vérification : **03 JUIN 2026**		Prochaine Vérification Avant le : **02 SEPTEMBRE 2026**
Propriétaire : **EKACICO**		Site de contrôle : **PLATEAU GENDAMERIE**

Absence protection collective



Plateaux non installés



Eléments d'amarrage et point d'ancrage insuffisants



Plancher non conforme



Société d'Inspection Générale d'Equipement	NATURE DE LA VERIFICATION : **AUDIT D'INSTALLATION D'ECHAFAUDAGE**	Fabricant : / Année de Fabrication : /
Date de Vérification : **03 JUIN 2026**		Prochaine Vérification Avant le : **02 SEPTEMBRE 2026**
Propriétaire : **EKACICO**		Site de contrôle : **PLATEAU GENDAMERIE**

Liaison à établir	Plateau installé et non verrouillé
