SIGE

SOCIETE D'INSPECTIONS GENERALES D'EQUIPEMENTS

Travaillons en toute sécurité !







INSPECTIONS-FORMATIONS-CONSEILS-ASSISTANCES-AUDIT TECHNIQUES
ARRETE N° 00050 MEPS/CAB du 19 MAI 2025 PORTANT AGREMENT

RAPPORT D'AUDIT TECHNIQUE D'UNE INSTALLATION DE TREUIL DE LEVAGE DU PROJET EKACICO PLATEAU GENDARMERIE

Société d'Inspection Générale d'Equipement	NATURE DE LA VERIFICATION : **AUDIT D'UNE INSTALLATION DE TREUIL DE LEVAGE**	Fabricant : IORI Année de Fabrication : 2024
Date de Vérification : **05 JUIN 2026**		Prochaine Vérification Avant le : **04 DECEMBRE 2026**
Propriétaire : **EKACICO**		Site de contrôle : **PLATEAU GENDAMERIE**

Famille : **Echafaudage fixe**		Localisation
Nature **Echafaudage de pied**		**PLATEAU GENDAMERIE**
Model : /	Numéro de série Planchers : /	N'interne : /

Textes de référence :	**Arrêté du 01 Mars 2004** **Code du Travail (Décret N°67-321 du 21 Juillet 1967)**
Type de Vérification :	**Etat de conservation et Conformité de l'installation**
Périodicité :	**Semestrielle**

IDENTIFICATION

Numero de série : **7917**		
Nature des travaux : Travaux de façade d'un immeuble R+14	Durée estimée **/**	Montage effectué par la société **EKACICO**

CARACTERISTIQUES

Dimensions : ☐ **Longueur du câble : / m** ☐ **Hauteur : 49 m**	Charges Maximale d'utilisation (CMU) **1000 Kg**	Type de structure **Voir documents technique**

Description **:** **Le treuil faisant l'objet de cette mission est utilisé du 9ième étage au 13ième étage.**	Appuis sur **CADRE ET DALLE**

Nombre de niveaux d'utilisation **5**	Accès à la machinerie **13ième étage**	Nombre de Stabilisateurs **/**	Protection de l'installation **Bâches**	Engins de levage : **Oui**

A – ASPECTS DOCUMENTAIRES

OBJET DE LA VERIFICATION	AVIS	ACTION(S) A ENTREPRENDRE(S)
Entourer les Avis retenus. NV = Non vérifié, NA = Non applicable, AE = Action à Entreprendre. S= Satisfaisant, NP= Non présenté, SO= Sans Objet		
A.1 Affichages	AE	Afficher sur le treuil de façon lisible et bien visible la charge maximale d'utilisation et les consignes de sécurité.
A.2 Notice d'instruction	NP	Disposer de la notice d'instruction sur le site.
A.3 Notice de montage	NP	Disposer de la notice de montage sur le site.
A.4 Notice d'installation et d'utilisation	NP	Disposer de la notice d'installation et d'utilisation sur le site.
A.5 Rapport de Sol ou de support	NA	
A.6 Rapport Effet de vent	NP	

Société d'Inspection Générale d'Equipement	NATURE DE LA VERIFICATION : **AUDIT D'UNE INSTALLATION DE TREUIL DE LEVAGE**	Fabricant : IORI Année de Fabrication : 2024
Date de Vérification : **05 JUIN 2026**		Prochaine Vérification Avant le : **04 DECEMBRE 2026**
Propriétaire : **EKACICO**		Site de contrôle : **PLATEAU GENDAMERIE**

OBJET DE LA VERIFICATION	AVIS	ACTION(S) A ENTREPRENDRE(S)
Entourer les Avis retenus. NV = Non vérifié, NA = Non applicable, AE = Action à Entreprendre. S= Satisfaisant, NP= Non présenté, SO= Sans Objet		
A.7 Rapports de vérification	NV	*Aucun rapport de vérification précédant présenté.*

B – POINTS INSPECTES

OBJET DE LA VERIFICATION	AVIS	ACTION(S) A ENTREPRENDRE(S)
Entourer les Avis retenus. NV = Non vérifié, NA = Non applicable, AE = Action à Entreprendre. S= Satisfaisant		
1-Implantation		
1.1 Liberté d'accès / Base, 4 pieds à roues	S	
1.2 Ecoulements des eaux pluviales, circulation des piétons	NA	
1.3 Choix des points d'appuis	S	
2-APPUIS		
2.1 Résistance des appuis	S	
2.2 Calage / Stabilisateur	AE	*Afficher sur l'équipement le poids de la masse servant de contre-poids.*
2.3 Platines	AE	*Procéder au verrouillage de la platine contre la dalle servant d'appui.*
2.4 Vérins	NA	
3-STRUCTURE		
3.1 Compatibilité et mise en œuvre des éléments	S	
3.2 Portique de départ	S	
3.3 Poteaux / Croisillon / Montant	S	
3.4 Clavetage des montants	NA	
3.5 Câble de levage	AE	*Procéder au remplacement du câble de levage endommagé en tenant compte des caractéristiques fournit par le fabriquant. (Voir document technique ou notice d'instruction).* *Le câble présente des brins cassés ou défait sur certaines parties de sa longueur et montre un risque élevé de rupture.*
3.6 Crochet de levage	AE	*Procéder au remplacement du crochet de levage en tenant compte des caractéristiques fournit par le fabriquant. (Voir document technique ou notice d'instruction).* *Présence de rouille et linguet de sécurité hors service.*
3.7 Panier	AE	*Afficher sur panier de levage sa charge maximale d'utilisation.*
4-AMENAGEMENTS		
4.1 Bâchage, tôlage, filets	AE	*Remplacer la bâche de protection déchiré.*

Société d'Inspection Générale d'Equipement	NATURE DE LA VERIFICATION : **AUDIT D'UNE INSTALLATION DE TREUIL DE LEVAGE**	Fabricant : IORI Année de Fabrication : 2024
Date de Vérification : **05 JUIN 2026**		Prochaine Vérification Avant le : **04 DECEMBRE 2026**
Propriétaire : **EKACICO**		Site de contrôle : **PLATEAU GENDAMERIE**

OBJET DE LA VERIFICATION	AVIS	ACTION(S) A ENTREPRENDRE(S)
Entourer les Avis retenus. NV = Non vérifié, NA = Non applicable, AE = Action à Entreprendre. S= Satisfaisant		
4.2 Sapine de levage / Engins de levage	NA	
4.3 Pare gravois	NA	
5-STABILITE		
5.1 Résistance des appuis / descente de charges	**AE**	*Afficher sur l'équipement le poids de la masse servant de contre-poids.*
5.2 Contreventements	S	
5.3 Ancrages	AE	*Procéder au verrouillage de la platine contre la dalle servant d'appui.*
5.4 Amarrages	NA	

B – POINTS INSPECTES

OBJET DE LA VERIFICATION	AVIS	ACTION(S) A ENTREPRENDRE(S)
Entourer les Avis retenus. NV = Non vérifié, NA = Non applicable, AE = Action à Entreprendre. S= Satisfaisant		
7- DISPOSITIFS DE PROTECTION COLLECTIVE		
7.1 Côté extérieur	AE	*Procéder au balisage de la zone de charge au RDC et 9ième étage.* *Afficher au RDC dans la zone de levage, la consigne interdit de passer sous la charge.*
7.2 Côtés latéraux	AE	*Baliser le coté latérale gauche de l'installation afin d'empêcher toute accès à cette zone. Risque de chute élevée.*
7.3 Côté Intérieur	S	
8- ACCES		
8.1 Escaliers	NA	
8.2 Echelles	NA	
9- PROTECTION VIS-A-VIS DES TIERS		
9.1 Interdiction d'accès	AE	*Afficher sur l'équipement : Accès interdit à toute personne non autorisée.*
9.2 Lignes électriques	NA	
9.3 Antennes	NA	
9.4 Risques de collision	NA	
9.5 Protection contre les chutes d'objets	S	*Installer un dispositif de verrouillage sur le panier de levage*
10- ESSAI EN CHARGE		
10.1 Essai en charge	AE	*Les actions à entreprendre doivent être réalisées avant tout essai en charge.*

Société d'Inspection Générale d'Equipement	NATURE DE LA VERIFICATION : **AUDIT D'UNE INSTALLATION DE TREUIL DE LEVAGE**
Date de Vérification : **05 JUIN 2026**	Prochaine Vérification Avant le : **04 DECEMBRE 2026**
Propriétaire : **EKACICO**	Site de contrôle : **PLATEAU GENDAMERIE**

S.I.G.E
Société d'Inspections Générales d'Equipements
Tél: 07 08 21 26 44 / 01 51 81 70 25
RCCM: CI-ABJ-03-2021-B13-05773
N°CC 2173917 Q

C- AVIS GENERAL

L'INSPECTION DU TREUIL DE LEVAGE A MIS EN EVIDENCE DES NON CONFORMITES PRESENTANT DES RISQUES POUVANT METTRE EN DANGER LES UTILISATEURS ET TOUT AUTRE PERSONNE DANS LA ZONE DE LEVGE.

LES ACTIONS A ENTREPRENDRE MENTIONNEES DANS LE TABLEAU DOIVENT ETRE REALISEES ET FAIRE L'OBJET D'UNE LEVEE DE RESERVE AVANT TOUTE UTILISATION.

LE TREUIL DE LEVAGE VERIFIE EST NON CONFORME ET NE PEUT ETRE UTILISEES.

ACTIONS A ENTREPRENDRE

OBLIGATION DE LEVER LES RESERVES

Fait à Abidjan, le 08 Juin 2026

L'Inspecteur

ERNEST EHOUE BONZOU

Le Responsable

S.I.G.E
Société d'Inspections Générales d'Equipements
Tél: 07 08 21 26 44 / 01 51 81 70 25
RCCM: CI-ABJ-03-2021-B13-05773
N°CC 2173917 Q

Société d'Inspection Générale d'Equipement	NATURE DE LA VERIFICATION : **AUDIT D'UNE INSTALLATION DE TREUIL DE LEVAGE**	Fabricant : IORI Année de Fabrication : 2024
Date de Vérification : **05 JUIN 2026**		Prochaine Vérification Avant le : **04 DECEMBRE 2026**
Propriétaire : **EKACICO**		Site de contrôle : **PLATEAU GENDAMERIE**

ANNEXE PHOTO

Société d'Inspection Générale d'Equipement	NATURE DE LA VERIFICATION : **AUDIT D'UNE INSTALLATION DE TREUIL DE LEVAGE**	Fabricant : IORI Année de Fabrication : 2024
Date de Vérification : **05 JUIN 2026**		Prochaine Vérification Avant le : **04 DECEMBRE 2026**
Propriétaire : **EKACICO**		Site de contrôle : **PLATEAU GENDAMERIE**




TREUIL DE LEVAGE VERIFIE, AUCUNE CONSIGNE DE SECURITE, CHARGE MAXIMALE NON AFFICHEE



Société d'Inspection Générale d'Equipement	NATURE DE LA VERIFICATION : **AUDIT D'UNE INSTALLATION DE TREUIL DE LEVAGE**	Fabricant : IORI Année de Fabrication : 2024
Date de Vérification : **05 JUIN 2026**		Prochaine Vérification Avant le : **04 DECEMBRE 2026**
Propriétaire : **EKACICO**		Site de contrôle : **PLATEAU GENDAMERIE**

PLAQUE SIGNALETIQUE



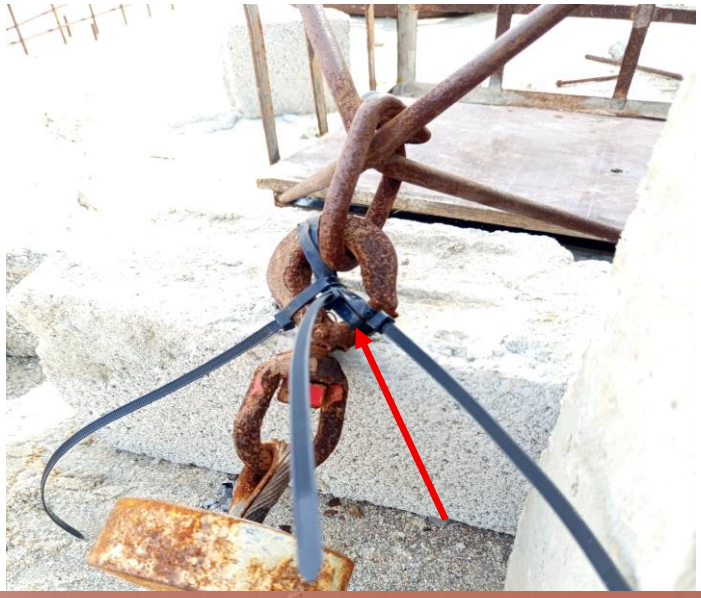



Présence d





Société d'Inspection Générale d'Equipement	NATURE DE LA VERIFICATION : **AUDIT D'UNE INSTALLATION DE TREUIL DE LEVAGE**	Fabricant : IORI Année de Fabrication : 2024
Date de Vérification : **05 JUIN 2026**		Prochaine Vérification Avant le : **04 DECEMBRE 2026**
Propriétaire : **EKACICO**		Site de contrôle : **PLATEAU GENDAMERIE**

Câble de levage présentant des brins casses et toron défait



Panier de levage non sécurisé



Bouton de commande non identifiés
